



DEVAM EDEN YATIRIMLAR 2018

İÇİNDEKİLER

ADALET BAKANLIĞI	1
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	1
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	2
AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ	2
İLLER BANKASI KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	4
KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	5
DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	7
KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	8
İL ÖZEL İDARESİ	9
KAYSERİ RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ	10
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	10
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	11
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	11
KIRŞEHİR İLETİM ŞEBEKELERİ İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ	12
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	13
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	16
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	17
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ	18
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	18
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	19
BELEDİYELER	20


ADALET BAKANLIĐI

ADALET BAKANLIĐI 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE /İHALE TUTARI (₺)	ÖDENEĐİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
KAPALI CEZA EVİ İNFAZ KURUMU	MERKEZ	2017 2020	291.480.000	20.000.000		11	



İÇİŞLERİ BAKANLIĐI

İÇİŞLERİ BAKANLIĐI 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĐİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
MERKEZ HÜKÜMET KONAĐI YAPIMI	MERKEZ / KIRŞEHİR	(2017-2020)	29.752.000,00	3.000.000,00	0	YER TESLİMİ YAPILDI	


İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
BOZTEPE İLÇE EMNİYET AMİRLİMİĞİ HİZMET BİNASI YAPIM	BOZTEPE	2016-2019	3.658.000,00	3.658.000	2.815.964,39	75	
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI YAPIM	MERKEZ	2016-2019	26.526.000	15.303.000	3.067.627,57	15	

AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ


AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
Derlik ve Merkezi Birimler Eğitim Fakültesi	Bağbaşı Yerleşkesi	2008-2018	229.600	22.600	51.855.690,26	85	

	Mimarlık-Mühendislik Fakültesi						90	
	Ziraat Fakültesi						95	
	Kongre Kültür Merkezi						80	
	Tıp Fakültesi (Morfoloji) Binası						23	
Sağlık Sektörü	FTR Hastanesi ve Yüksekokulu	Bağbaşı Yerleşkesi	2014-2018	35.320	7.500	13.195.655.47	47	
Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri	Maraton Tribünü	Bağbaşı Yerleşkesi	2007-2018	34.000	3.000	1.379.088.80	63	
	Stadyum						90	



İLLER BANKASI KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLBANK A.Ş. KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI	YERİ (İlçesi)	BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	YILI ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA (₺) [KDV Dahil]	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
YAPIM İŞLERİ							
KURANCILI A.A.T. İNŞAATI YAPIM İŞİ	KURANCILI	2017-2018	2.798.772,89	775.771,57	1.238.962,63	İş devam ediyor, fiziki gerçekleşme % 55	
PROJE İŞLERİ							
KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI KÖYLERİ (7 ADET) İÇMESUYU PROJESİ	ÇİÇEKDAĞI	2017-2018	186.145,00	157.750,00	0,00	İş Devam Ediyor.	
MUCUR SAYISAL HALİHAZIR HARİTA YAPIM İŞİ	MUCUR	2017-2018			0,00	Arazi Çalışmaları Devam Ediyor.	
KÖSELİ SAYISAL HALİHAZIR HARİTA YAPIM İŞİ	KÖSELİ	2017-2018			0,00	Arazi Çalışmaları Devam Ediyor.	

KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


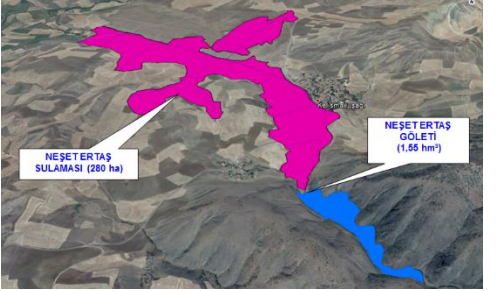
KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR


YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
Kırşehir-Boztepe Yolu TY İşi	Boztepe	05.09.2016 31.12.2018	17.575.000	2.000	15.600.000	90%	
Kaman-Kızıközü Hirfanlı Baraj Varyantı Yolu İkmal İşi	Kaman	20.04.2017 31.12.2019	24.100.000	0	7.417.000	42%	
Kaman-Savcılı-Kırşehir Yolu TY İşi	Kaman	18.07.2017 31.12.2020	99.281.000	2.000	2.525.000	7%	
Akpınar-İsahocalı Ayr.-4. Bl Hd. Arası Bsk İkmal İşi	Akpınar	28.03.2017 31.12.2018	62.001.000	1.425.000	23.268.000	87%	

Kırşehir Çevre Yol Ayr.-Akpınar-İsahocalı Ayr. (Km:145+435-158+250)	Akpınar	11.07.2011 31.12.2018	53.054.000	1.000.000	43.567.000	83%	
Hacıbektaş Ayr.-Kırşehir Çevre Yol Ayr. (Km:78+750-124+790)	Mucur	12.07.2011 31.12.2018	68.676.000	1.000.000	44.558.000	71%	
Kesikköprü Köprüsü Ve Bağlantı Yolları	Mucur	21.06.2016 31.12.2019	25.557.000	750.000	2.150.000	16%	
Kızılırmak (Hirfanlı Baraj Varyantı) Köprüsü Yapım İşi	Kaman	02.03.2016 31.05.2018	16.096.000	5.000.000	13.810.000	98%	
Hacıbektaş Ayr.-Kırşehir Çevre Yol Ayr. (Km:78+750-124+790) BSK İkmal Yapım İşi	Mucur	05.09.2017 31.12.2019	69.553.000	1.000.000	0	0%	2018 yılında çalışmalara başlanacaktır.

DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



DSİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
Kırşehir İçmesuyu İsale Hattı: Kırşehir İlinde 2045 yılına kadar 233 796 kişinin 609 l/s içme ve kullanma suyunu sağlayacak işe 15.04.2015 tarihinde başlanmış olup % 70 fiziksel gerçekleştirme sağlanmıştır. 18 adet YAS kuyusundan Kırşehir İline yılda maksimum 19,20 milyon m ³ içme ve kullanma suyu sağlanabilecektir.	Merkez	2015-2017	28.461.034	-	11.584.480	% 100	
Akpınar Neşet ERTAŞ Barajı: Barajın temelden yüksekliği 50,00 metredir. 1,55 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj, 2.800 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir.	Akpınar	2016-2019	14.556.860	-	958.604	% 7	
Boztepe Çamalak Göleti: Göletin temelden yüksekliği 17,50 metredir. 1,62 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip gölet, 1.670 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir.	Boztepe	2015-2018	7.528.133	-	2.102.853	% 42	

<p>Akpınar Pekmezci Göleti İkmalı 2. Kısım: Barajın temelden yüksekliği 35,00 metredir. 1,45 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj, 3.870 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecektir.</p>	Akpınar	2014-2018	7.139.000	-	233.730	% 38	
<p>Kaman Yukarıçiftlik (Çiftlikbağla) Göleti Sulaması Yenileme: Mevcutta işletmede olan 24.050 dekar sulamada yenileme (klasik sistemden borulu sisteme dönüştürme) yapılarak daha iyi (modern) şartlarda sulama yapılması hedeflenmektedir</p>	Kaman	2017-2019	-	-	--	İhale Süreci Devam etmektedir.	



KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR					
YATIRIMIN ADI VE KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	HARCAMA TUTARI (₺)	YATIRIM GÖRSELİ
Kırşehir İli Merkez İlçesi Karakurt Kaplıcası Proje Temin İşi	MERKEZ	28.10.2013	24.08.2014	16.388,00	

Kırşehir İli, Kaman İlçesi Gaffar Mahallesi 35 Ada 1 Parselde Yer Alan Yeni Mahalle Camiinin Yıkılarak Yerine Yeni Cami Yapılması İşi	KAMAN	13.07.2017	13.07.2019	0,00	
Kırşehir İli, Merkez, Cacabey Medresesi Üst Örtü Yapılması Projesi Hizmet Alımı İşi	MERKEZ	-	-	İHALE AŞAMASINDA	


İL ÖZEL İDARESİ

İL ÖZEL İDARESİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
KAMAN KÜLTÜR EVİ (AHİ KONAĞI) YAPIMI	KAMAN / KIRŞEHİR	2017-2018	2.790.000,00	1.000.000,00	803.458,37	24	
MUCUR AHİ KONAĞI YAPIMI	MUCUR / KIRŞEHİR	2017-2018	943.200,00	1.050.000,00	299.458,70	27	


KAYSERİ RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
YENİ ARKEOLOJİ MÜZESİ YAPIMI	KIRŞEHİR MERKEZ	2015 - 2018	18.215.845,02	21.494.927,52	15.107.620,89	95	

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
ERKEK ÇOCUK SEVGİ EVLERİ SİTESİ VE HİZMET BİNASI YAPIMI	MERKEZ / KIRŞEHİR	2017-2018	4.581.000,00	3.845.196,34	3.586.963,10	% 59	

KAMAN HUZUREVİ	KAMAN	2016/2019		200.000		Protokol İmzalandı, proje ihalesine çıkıldı ihale yapılarak projenin teslim edilmesi beklenmektedir.	
----------------	-------	-----------	--	---------	--	--	--

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI	MERKEZ	2016-2018	5.989.000,00			10	

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ


GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
Mucur Futbol Sahası Soyunma Odası ve Bakım Onarım İşi	Mucur İlçesi	31.10.2017 18.06.2018	232.800,00 TL	SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞINCA ÖDENECEK	YOK	% 65	

Akçakent Halı Saha ve Soyunma Odası Yapım İşi	Akçakent İlçesi	20.11.2017 27.07.2018	240.240,00 TL	SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞINCA ÖDENECEK	YOK	% 60	
---	-----------------	--------------------------	------------------	--	-----	------	---





KIRŞEHİR İLETİM ŞEBEKELERİ İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR İLETİM ŞEBEKELERİ İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
PETLAS TRAFİKO MERKEZİ TEVSIYAT	MERKEZ	14.04.2017 10.03.2018	1.600.000	500.000	184.830	10%	
KIZILIRMAK TM	MERKEZ		6.000.000	2.000	6.000.000	Proje Aşamasında	
KIRŞEHİR-PETLAS EİH YENİLEME	MERKEZ		1.500.000	2.000	1.500.000	Proje Aşamasında	

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
30 AĞUSTOS ZAFER İLKOKULU 36 DERSLİK	MERKEZ	22.12.2016 24.12.2018	9.500.000	5.000.000	2.646.912	40	
24 DERSLİK SOSYAL BİLİMLER LİSESİ - 200 ÖĞRENCİLİK PANSİYON VE SPOR SALONU	MERKEZ	11.10.2016 30.10.2018	17.500.000	10.305.000	3.821.000	22	
KAYABAŞI ANAOKULU 4 DERSLİK	MERKEZ	19.07.2017 21.07.2018	1.150.000	700.000	332.933	30	
CUMHURİYET ORTAOKULU 36 DERSLİK	MERKEZ	01.12.2017 08.02.2020	10.550.000	2.100.000	0	Yer Teslimi Yapıldı	


MUCUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 24 DERSLİK	MUCUR	14.09.2017 15.08.2019	8.500.000	1.240.100	1.202.545	17	
ÇİÇEKDAĞI ANAOKULU 4 DERSLİK	ÇİÇEKDAĞI	15.09.2017 30.08.2018	1.780.000	250.000	182.768	10	
KAMAN KIZ İMAM HATİP LİSESİ 24 DERSLİK	KAMAN	28.06.2017 17.02.2019	9.000.000	4.500.000	1.083.278	10	
KAMAN MELİKŞAH ORTAOKULU 24 DERSLİK	KAMAN	28.11.2016 20.07.2018	9.132.000	4.450.000	3.375.228	47	
KAMAN İMAM HATİP LİSESİ 24 DERSLİK	KAMAN	14.09.2017 04.09.2019	9.500.000	850.000	949.022	10	

KAMAN YENİHAYAT ORTAOKULU 24 DERSLİK	KAMAN	20.09.2017 24.10.2018	4.500.000	1.000.000	934.351	20	
PANSİYON VE ÇOK AMAÇLI ATÖLYE BİNASI	KAMAN	05.09.2017 26.08.2019	9.000.000	750.000	737.788	10	
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ UYGULAMA OTELİ 200 YATAKLI	MERKEZ	17.11.2017 12.08.2020	3.312.000	3.000.000	0	Yer Teslimi Yapıldı	
KÜMBETALTI ANAOKULU 4 DERSLİK	MERKEZ					İHALE AŞAMASINDA	
CUMHURİYET İLKOKULU 36 DERSLİK	MERKEZ					İHALE AŞAMASINDA	
AKPINAR İMAM HATİP ORTAOKULU 24 DERSLİK	AKPINAR					İHALE AŞAMASINDA	
40 DERSLİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ + 10 ATÖLYE	MERKEZ					İHALE AŞAMASINDA	

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
S.B. AHİ EVRAN ÜN.EĞ.ARAŞT.HAST.150 YATAK EK BİNA İNŞ.	MERKEZ					Proje çalışmaları devam ediyor	
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ	MERKEZ					Proje çalışmaları devam ediyor	
Halk Sağlığı Müdürlüğü+ Halk Sağlığı Laboratuvarı	MERKEZ	2014-2018	8.249.000	750.000		Sağlık Bakanlığı 15.06.2017 de ihale yaptı. Proje revize Çalışmaları devam ediyor	
Toplum Sağlığı Merkezi(Sağlıklı Yaşam Merkezi)+Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu	MERKEZ	2017-2018				Arsa çalışmaları devem ediyor	
Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu	KAMAN	2017-2018				Arsa işlemleri tamamlandı. İhalesi yapılacak	
SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ	MERKEZ	2017-2018				Arsa çalışmaları devem ediyor	
Ahi Evran Aile Sağlığı Merkezi+112 Acil Sağlık İstasyonu	MERKEZ	2017-2018				Arsa çalışmaları devem ediyor	

AKÇAKENT 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU	AKÇAKENT	2016-2018	535.000	417.000	80.842	30	
KAMAN 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU	KAMAN	2017-2018				Arsa çalışmaları devam ediyor	
MUCUR 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU	MUCUR	2016-2018				Arsa çalışmaları devam ediyor	
KIRŞEHİR AŞIKPAŞA 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU	MERKEZ	2016-2018				Arsa çalışmaları devam ediyor	

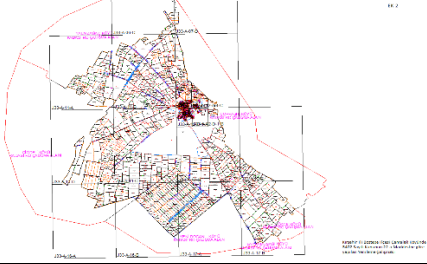

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
SOSYAL TESİS (MESCİT YAPIMI)	KIRŞEHİR MERKEZ (Aşıkpaşa Tabiat Parkı)	22.03.2017-30.09.2017 (süre uzatımı dahil)	326.152,00	375.000	169.270	% 90	


KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ



KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
3402 SAYILI KANUNUN 22-A MADDESİNE GÖRE YAPILAN YENİLEME KADASTROSU	Ek-1 deki 29 birim	19.09.2016 10.02.2018	2.066.408,00	1.120.899,30	2.023.633,36	98	
3402 SAYILI KANUNUN EK-1 MADDESİNE GÖRE YAPILAN KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI	Ek-1 deki 35 birim	24.07.2017 18.07.2018	1.174.206,00	304.660,95	304.660,95	26	

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ


İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
YENİ KIRŞEHİR MÜZESİ	MERKEZ İLÇE	2015 - 2018	18.215.845,02	21.494.927,52	15.107.620,89	95	

KARAKKURT KAPLICASI JEOTERMAL ETÜT VE KUYU ÇALIŞMASI	MERKEZ İLÇE		1.806.670,44	456.450,00	456.450,00		
MERKEZ KALEHÖYÜK KAZI ÇALIŞMASI	MERKEZ İLÇE		477.993,70	50.000,00	50.000,00		
BÜYÜK TEFLEK KÖYÜ KIZI ÇALIŞMASI	ÇİÇEKDAĞI İLÇESİ		197.994,00	739,24			





ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

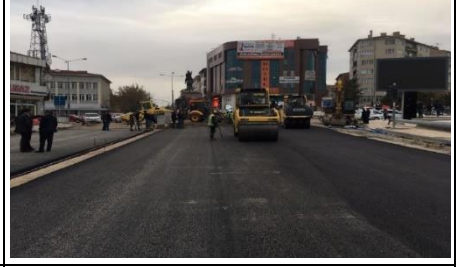

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KOHTROL PROJELERİ (33 ADET)	DEĞİŞİK MEVKİLERDE	2017/2017	3.151.228			50	


BELEDİYELER

KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR





YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
Karayolları Kampüs Projesi	Merkezi İlçe Bahçelievle r Mahallesi	15.05.2017/1 5.05.2018	9.133.200	7.623.000	4.889.840	54	
Şehir İçi Minibüs Terminali Yapım İşi	Merkezi İlçe Kuşdilli Mahallesi	18.08.2017/1 8.02.2019	15.244.420	5.000.000	1.437.165	11	
(2016-602577) KALE ÇEVRESİ (UZUN ÇARŞI VE YENİ 1. ÇARŞI) ÇEVRE DÜZ. VE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA YAPIM İŞİ	KIRŞEHİR MERKEZ (KUŞDİLLİ MAHALLESİ KALE ÇEVRESİ VE UZUN ÇARŞI)	16.03.2017 29.04.2018	6.454.600	2.755.527	2.755.527	42	
KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI İLE SERT ZEMİN DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	KIRŞEHİR MERKEZ (MUHTELİF CADDE VE SOKAKLAR)	24.06.2016 12.12.2018	6.976.644	4.390.571	4.390.571	63	

KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI İLE YOL KALDIRIM DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ	KIRŞEHİR MERKEZ (MUHTELİF CADDE VE SOKAKLAR)	14.07.2016 31.12.2018	8.250.955	2.993.959	2.993.959	36	
ASFALT YAPIM İŞİ	KIRŞEHİR MERKEZ (MUHTELİF CADDE VE SOKAKLAR)	11.07.2016 01.07.2018	15.198.400	10.755.878	10.755.878	70	
ŞEHRİN MUHTELİF CADDELERİNDE SERT ZEMİN İLE PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İNŞAAT YAPIM İŞİ	KIRŞEHİR MERKEZ (MEHMET ALİ YAPICI BULVARI, PROF. DR. MEHMET ALİ ALTIN BULVARI, AŞIKPAŞA BULVARI, TERME CADDESİ, ATATÜRK CADDESİ,)	28.06.2017 03.09.2018	34.408.800	9.086.780	9.086.780	32	

AKÇAKENT BELEDİYESİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
DÜĞÜN SALONU	YENİKENT MAH.	20.07.2017/ DEVAM EDİYOR	750.000	BELEDİYE İMKANLARI	Devam ediyor	%5	

ÇİÇEKDAĞI BELEDİYESİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
ŞEHİRİÇİ İMAR YOLLARININ KUMLAMA VE REGLAJ ÇALIŞMASI	YENİ MAHALLE	2003/2018	120.000	120.000	120.000		
İÇME SUYU VE KANALİZASYON YAPIMI	YENİ MAHALLE	2017/2018	100.000	100.000	100.000		
PARK VE BAHÇE YAPIMI	FEVZİ ÇAKMAK MH.	2017-2018	450.000	450.000	300.000		
PARKE YOL YAPIMI	MUHTELİF YOLLAR	2017-2018	1.017.020	1.315.840	YER TESLİMİ YAPILDI		

KAMAN BELEDİYESİ 2018 YILI DEVAM EDEN YATIRIMLAR

YATIRIMIN ADI ve KARAKTERİSTİK	YERİ	BAŞLANGIÇ/ BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (₺)	ÖDENEĞİ (₺)	TOPLAM HARCAMA TUTARI (₺)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME %	YATIRIM GÖRSELİ
BELEDİYE HİZMET BİNASI	YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:5 KAMAN	23/06/2015	5.939,798,64	--	5.639,798,64	90	
